

COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno

























INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ED ATTREZZATURE PUBBLICHE SULLA VIA CORVO CON IMPIANTO DI COLLEGAMENTO MECCANIZZATO - PROJECT FINANCING ART. 193, D.LGS. N° 36/2023 E S.M.I.

PROPOSTA DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(art. 6, allegato I.7 d.lgs 36/2023)



A- 06	CRONOPROGRAMMA
	proponente : G.E.M.A.R. s.p.a.

ID	 	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 2, 2025 apr mag giu			Tri 3, 2025 lug ago set			Tri 4, 2025 ott nov dic			Tri 1, 2026 gen feb mar			Tri 2, 2026 apr mag giu					
1			Preparazione del cantiere	10 g	mar 15/07/25	lun 28/07/25																		
2			Opere di consolidamento sommitali	30 g	mar 29/07/25	lun 08/09/25																		
3			Realizzazione viabilità temporanee	75 g	mar 09/09/25	lun 22/12/25																		
4			Scavi di sbancamento	85 g	mar 23/12/25	lun 20/04/26																		
5			Opere di Fondazione in c.a.	40 g	mar 21/04/26	lun 15/06/26																		
6			Opere in elevazione in c.a.	420 g	mar 16/06/26	lun 24/01/28																		
7			Opere in muratura	25 g	mar 25/01/28	lun 28/02/28																		
8			Impermeabilizzazioni	15 g	mar 25/01/28	lun 14/02/28																		
9			Intonaci interni	30 g	mar 29/02/28	lun 10/04/28																		
10			Impianti	35 g	mar 25/01/28	lun 13/03/28																		
11			Pavimentazioni	15 g	mar 29/02/28	lun 20/03/28																		
12			Opere di fabbro ed infissi	15 g	mar 25/01/28	lun 14/02/28																		
13			Rivestimenti in pietra	50 g	mar 29/02/28	lun 08/05/28																		
14			Tinteggiature interne	20 g	mar 21/03/28	lun 17/04/28																		
15			Opere di sistemazioni esterne	50 g	mar 21/03/28	lun 29/05/28																		
16			Installazione attrezzature parco giochi	15 g	mar 30/05/28	lun 19/06/28																		
17			Impianto ascensore	60 g	mar 29/02/28	lun 22/05/28																		
18			Realizzazione viabilità definitiva	25 g	mar 30/05/28	lun 03/07/28																		
19			Opere di giardinaggio	15 g	mar 30/05/28	lun 19/06/28																		
20			Smobilizzo cantiere	10 g	mar 04/07/28	lun 17/07/28																		


Progetto: Proget2
Data: mar 08/04/25


Attività


Divisione


Cardine

Riepilogo











Riepilogo progetto


Attività inattiva


Cardine inattiva

Riepilogo inattiva









Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva


Riepilogo inattiva


Attività manuale


Solo-durata


Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale











Solo inizio


Solo-fine


Attività esterne

Cardine esterno












Scadenza


Avanzamento

Avanzamento manuale







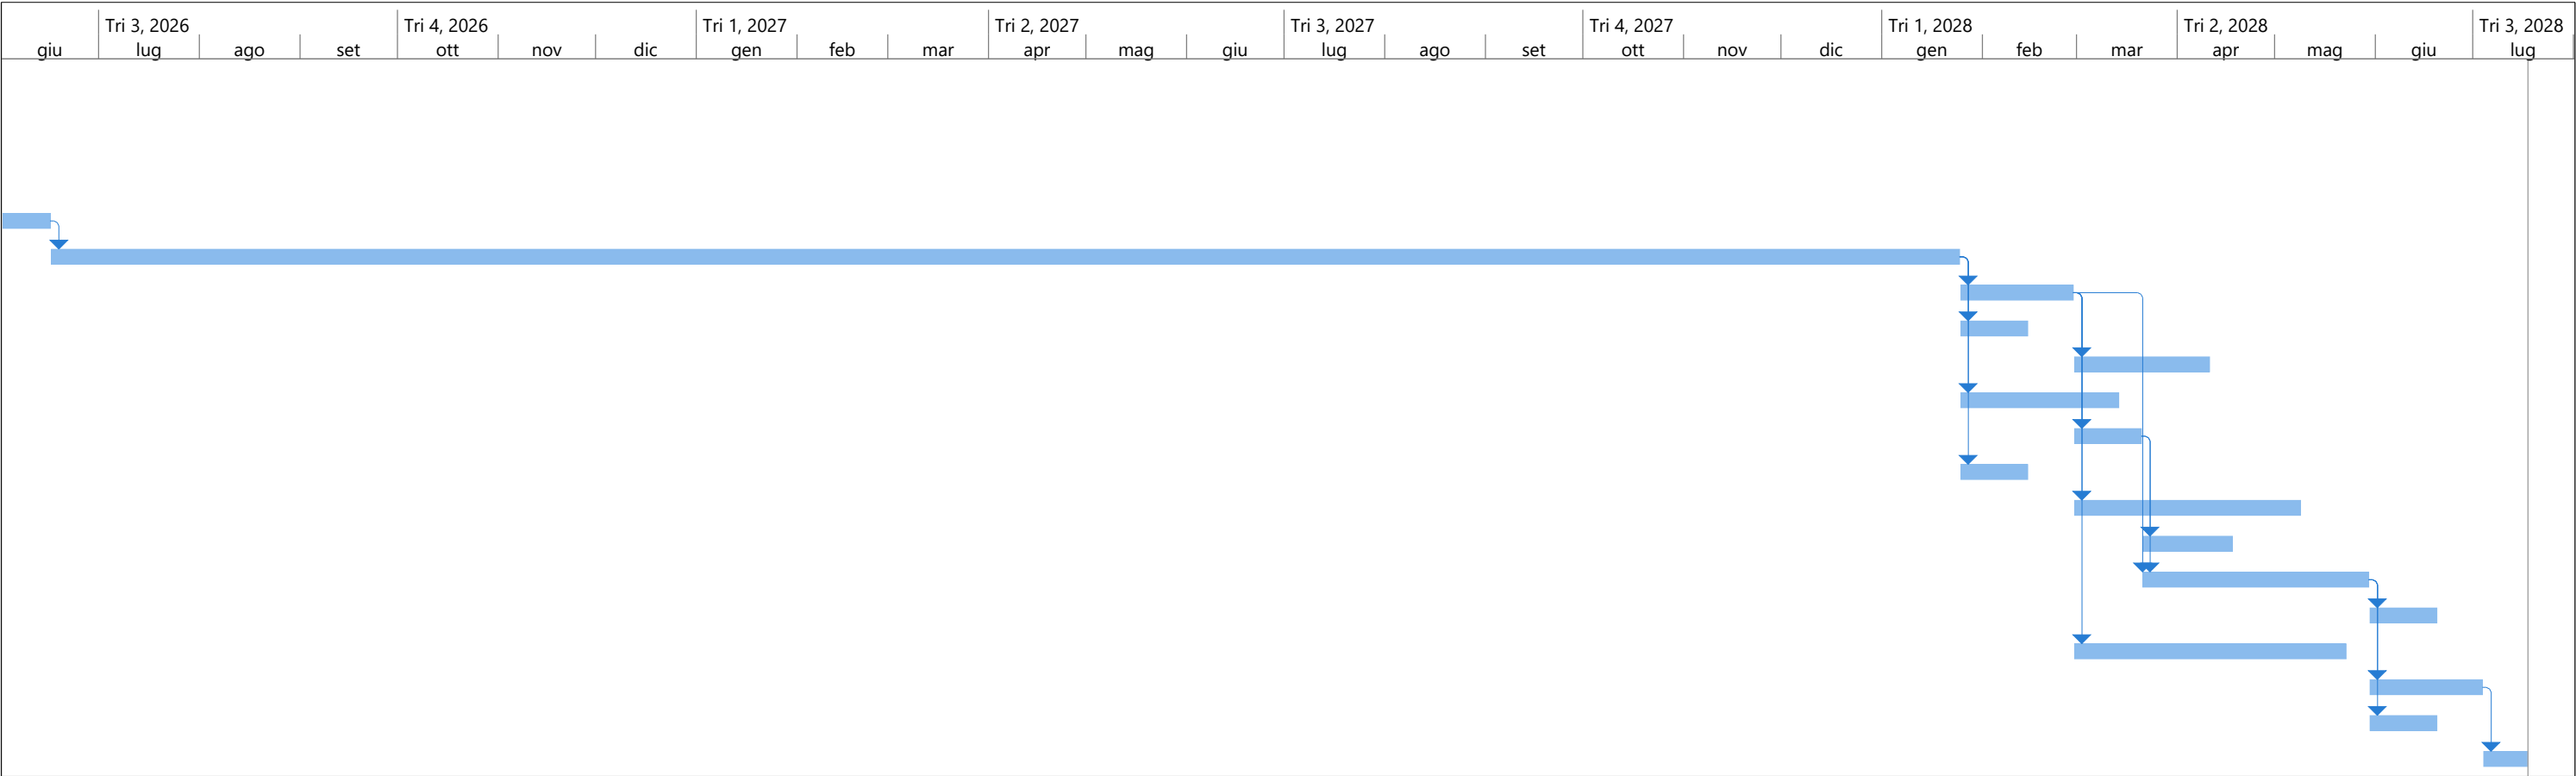

Progetto: Proget2 Data: mar 08/04/25	Attività	<div></div>	Riepilogo progetto	<div></div>	Attività manuale	<div></div>	Solo inizio	<div></div>	Scadenza	<div></div>
	Divisione	<div></div>	Attività inattiva	<div></div>	Solo-durata	<div></div>	Solo-fine	<div></div>	Avanzamento	<div></div>
	Cardine	<div></div>	Cardine inattiva	<div></div>	Riporto riepilogo manuale	<div></div>	Attività esterne	<div></div>	Avanzamento manuale	<div></div>
	Riepilogo	<div></div>	Riepilogo inattiva	<div></div>	Riepilogo manuale	<div></div>	Cardine esterno	<div></div>		
